


DURATA COMPLESSIVA LAVORI : 150 GIORNI

N. ord.	Attività	Durata gg.
01	sistemazione del cantiere, opere provvisoriale e sistemazioni logistiche	4
02	bonifica piano di posa	8
03	drenaggio verticale	12
04	sottofondo in stabilizzato e canalette perimetrali	10
05	manto in erba artificiale e montaggio attrezzature sportive	20
06	scavi e demolizioni per fondazioni e impianti	29
07	armatura, posa cavidotti e pozzetti elettrici, getto plinti	35
08	assemblaggio e montaggio carpenteria metallica	55
09	impianti elettrici (posa cavi e plafoniere)	10
10	manutenzione impianti elettrici esterni	8
11	pulizia e ripristini aree esterne impianto	3
12	pulizia e smobilizzo cantiere	10

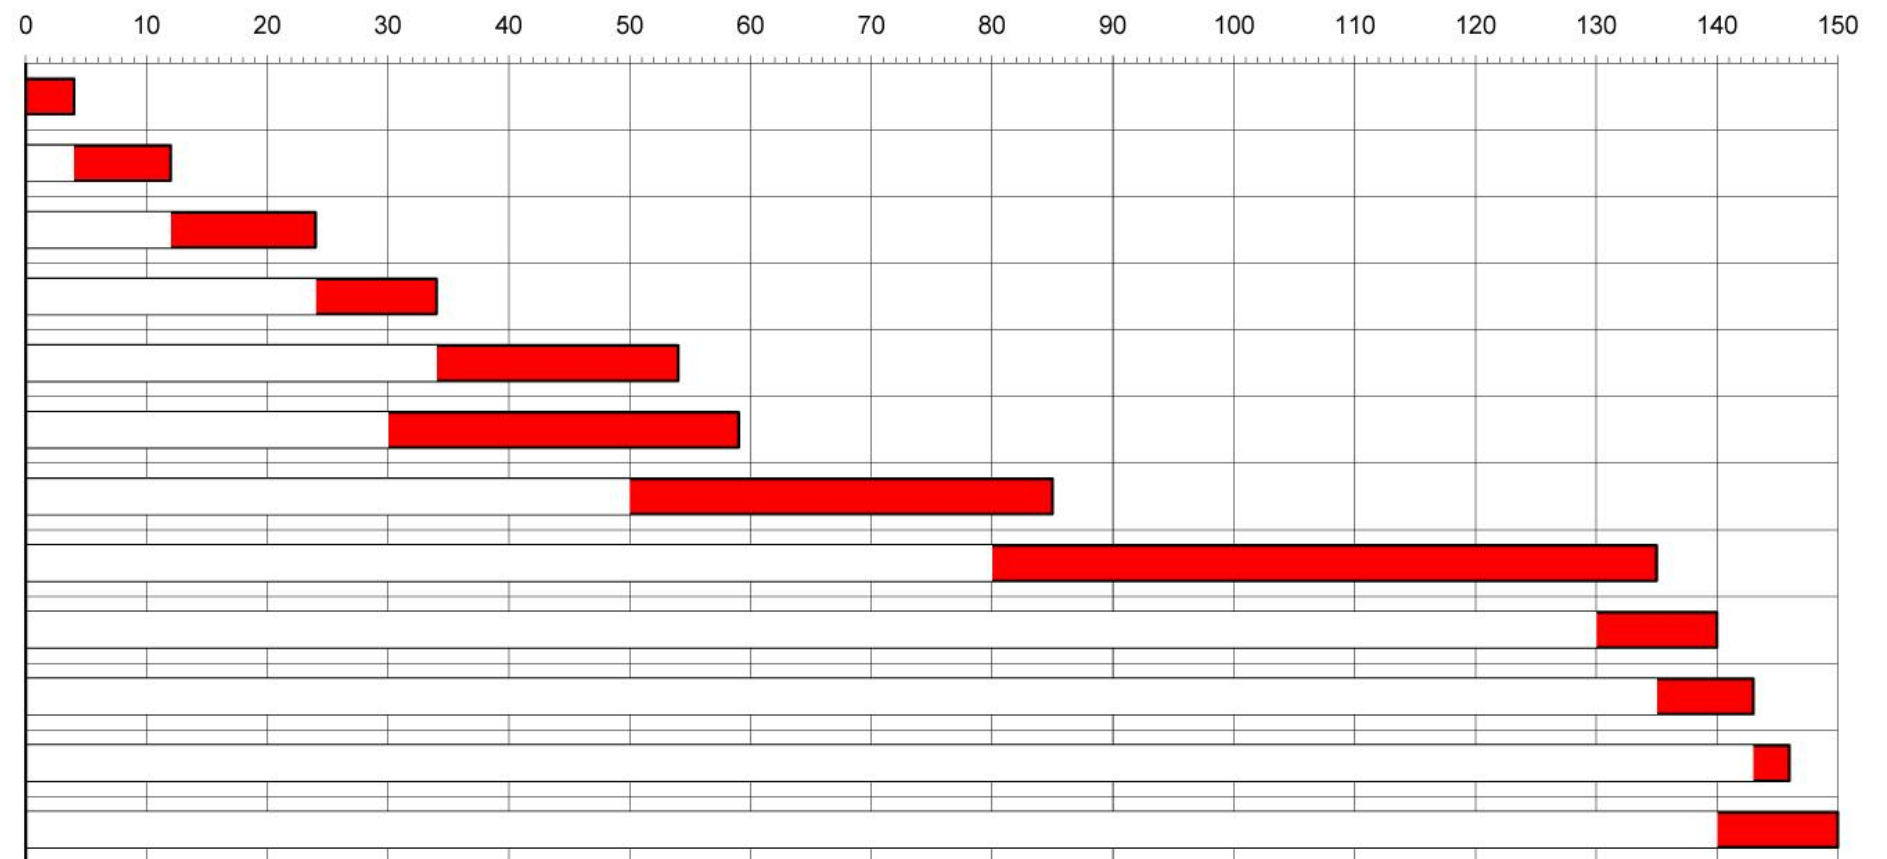

Note:

- Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, (D.Lgs 81/08 e 106/09) e dei P.O.S., l'Impresa appaltatrice dovrà presentare proprio "Cronoprogramma esecutivo dei lavori", sulla scorta del presente Cronoprogramma.
- Le categorie di opere in sovrapposizione temporale interesseranno luoghi e ambiti distinti dal cantiere, garantendo l'autonomia in sicurezza delle lavorazioni.
